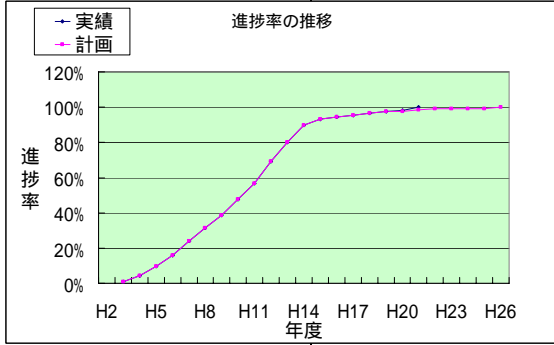


平成 20 年度再評価対象事業一覧表 (再評価実施後、一定期間(5~10年)が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業)
 (対象：平成 15 年度再評価実施事業)

| 番号 | 項目 | 事業名 (路・河川名等) | 事業目的 | 事業概要 | 事業の進捗状況 | 事業を巡る社会経済 情勢等の変化 | 費用対効果 の要因の変化 | CO2削減や代替案 等の可能性 | 再評価理由 | 対応方針 (事業課案) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|--|---|--|--|---|--|-----------------|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|
| | 再評価 時点 H15 | 森林居住環境整備事業 九千部横断線 事業主体：県 事業地：基山町、 鳥栖市、旧中原 町、上峰町、旧東 脊振村 | この事業は、基山町園部 地区から旧東脊振村松隈 地区までの林道を開設し、 当路線の森林利用区域 1,582ha(うち人工林 822ha)、森林所有者272 名の森林施業の効率化を 図ると共に森林の整備を 促進し、森林の持つ多面的 機能の持続的な発揮に資 することを目的とする。 | 全体事業費：C=81.3億円 計画延長：L=23,180m 幅員(車道)：W=4.0m 工期：H2～H17 (起点)基山町園部 (終点)東脊振村松隈 | H14末までの開設延長 L=20,080m (H14末進捗率 89.7%) (年平均進捗率 6.9%) | ・利用区域内での大規模な開 発による森林面積の変化はな い。 ・当該林道の近隣で新たな道 路の開設等はない。 | 事業採択時と比較し、費用対効果 の要因の大きな 変化はない。 (H14末B/C) B/C=1.54 | (コスト削減) ・補強土壁による現 地発生土(掘削残 土)の活用 ・コンクリート二次 製品(L型側溝、L 型擁壁)の活用 ・建設副産物(再生 アスファルト合 材等)の有効利用 | 5年以上 継続 | 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現時点 H20 | ・旧中原町は、 平成17年3月1日 に合併し、みや き町へ ・旧東脊振村は、 平成18年3月1日 に合併し、吉野 ヶ里町へ | 同上 | 全体事業費：C=89.5億円 計画延長：L=22,381m 幅員(車道)：W=4.0m 工期：H2～H26 (起点)基山町園部 (終点)吉野ヶ里町松隈 | H19末までの開設延長 L=21,872m (H19末進捗率 97.7%) (年平均進捗率 5.4%) | 同上 | 事業採択時と比較し、費用対効果 の要因の大きな 変化はない。 (H19末B/C) B/C=1.35 | 同上 | 再評価実施後 5年が経過 | 継続(理由) 事業の進捗は、 平成19年度末 で97.7% 今後、森林の整 備や間伐材等 の搬出を推進 するためには、 未完成区間の 早期完成が必 要であり、事業 の継続が適当 である。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 理由等 | | | (計画延長・事業費・全体 工期) 計画延長については、詳 細設計による線形の変更等 により延長が799m減少 した。 事業費については、地形 が急峻でかつ転石混じり 土の不安定な土質であり その法面保護工に多大な 経費を要したことによる 事業費の増。 全体工期については、上 記理由により、開設進捗が 遅れ、計画期間内の完了出 来ないため延長。 |  <p>進捗率の推移</p> <table border="1"> <caption>進捗率の推移 (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>計画 (%)</th> <th>実績 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>H5</td><td>20</td><td>10</td></tr> <tr><td>H8</td><td>40</td><td>25</td></tr> <tr><td>H11</td><td>60</td><td>40</td></tr> <tr><td>H14</td><td>80</td><td>60</td></tr> <tr><td>H17</td><td>90</td><td>80</td></tr> <tr><td>H20</td><td>95</td><td>90</td></tr> <tr><td>H23</td><td>98</td><td>95</td></tr> <tr><td>H26</td><td>100</td><td>98</td></tr> </tbody> </table> | 年度 | 計画 (%) | 実績 (%) | H2 | 0 | 0 | H5 | 20 | 10 | H8 | 40 | 25 | H11 | 60 | 40 | H14 | 80 | 60 | H17 | 90 | 80 | H20 | 95 | 90 | H23 | 98 | 95 | H26 | 100 | 98 | | | | | |
| 年度 | 計画 (%) | 実績 (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H5 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H8 | 40 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H11 | 60 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H14 | 80 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H17 | 90 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H20 | 95 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H23 | 98 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 100 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
