

# 佐賀道路 工事だより

令和6年8月

佐賀道路工事安全協議会

地域の皆様には、日頃より佐賀道路工事の推進について、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。

工事は地元のご協力により、暑さに負けずスムーズな進捗が実現できております。

改めまして、佐賀道路安全協議会一同より心からお礼申し上げます。

ありがとうございます。

扇町地区、北島地区では、現在10箇所です工事を進めております。

9月には扇町地区にて3件の新規工事（橋梁下部工）が追加予定です。

今後も、大型車による工事機材・資材の運搬を行ってまいりますので、利用道路での徐行、一時停止の徹底を行い、「地元車優先」の取組みを、引き続き行い工事期間中の「地元対応」「安全対策」「環境対策」に努めてまいります。今後も、ご理解とご協力を、お願いします。

なお、扇町地区、北島地区の窓口を担当しておりました工事が8月に工事完了しますので、代理として10月まで榊下村建設の樋口（ひぐち）が努めます。

工事へのご意見、ご相談がありましたら、下記へご連絡をお願いします。

扇町地区、北島地区 窓口（代理）： 榊下村建設 樋口 080-1805-1115

佐賀道路工事安全協議会 会長：（新規工事より選任し、次回お伝えします。）

※ 今後の工事予定は、2ページをご覧ください。

## 工事進捗状況について

北島地区より扇町方向 令和4年2月撮影



扇町地区より北島方向 令和4年2月撮影



北島地区より扇町方向 令和6年6月撮影



扇町地区より北島方向 令和6年6月撮影



上記の写真は、令和4年2月と令和6年6月撮影の写真です。

# 工事に伴う交通規制状況について

## 〈今後の交通規制について〉

### ◎ 現在、工事（佐賀道路）による、交通規制の予定はありません。

現在10カ所で作業しています。（詳細な位置は、3ページをご覧ください。）

各出入口より、大型車両（資機材、重機、セメント、土砂運搬など）の出入りが頻繁になってきます。


大型車の運搬時間 8：30～17：00を厳守し運搬して行きます。

各出入口には、大型車通行時に交通誘導員を配置し実施しますので、ご協力をお願いします。

今後、交通規制が計画された場合は、事前に「予告看板」などによりお知らせします。

今後の工事は、下方「今後の工事予定（8月～10月）について」をご覧ください。

※ 日程は予定ですので、天候による工事の進捗等で前後することがあります。

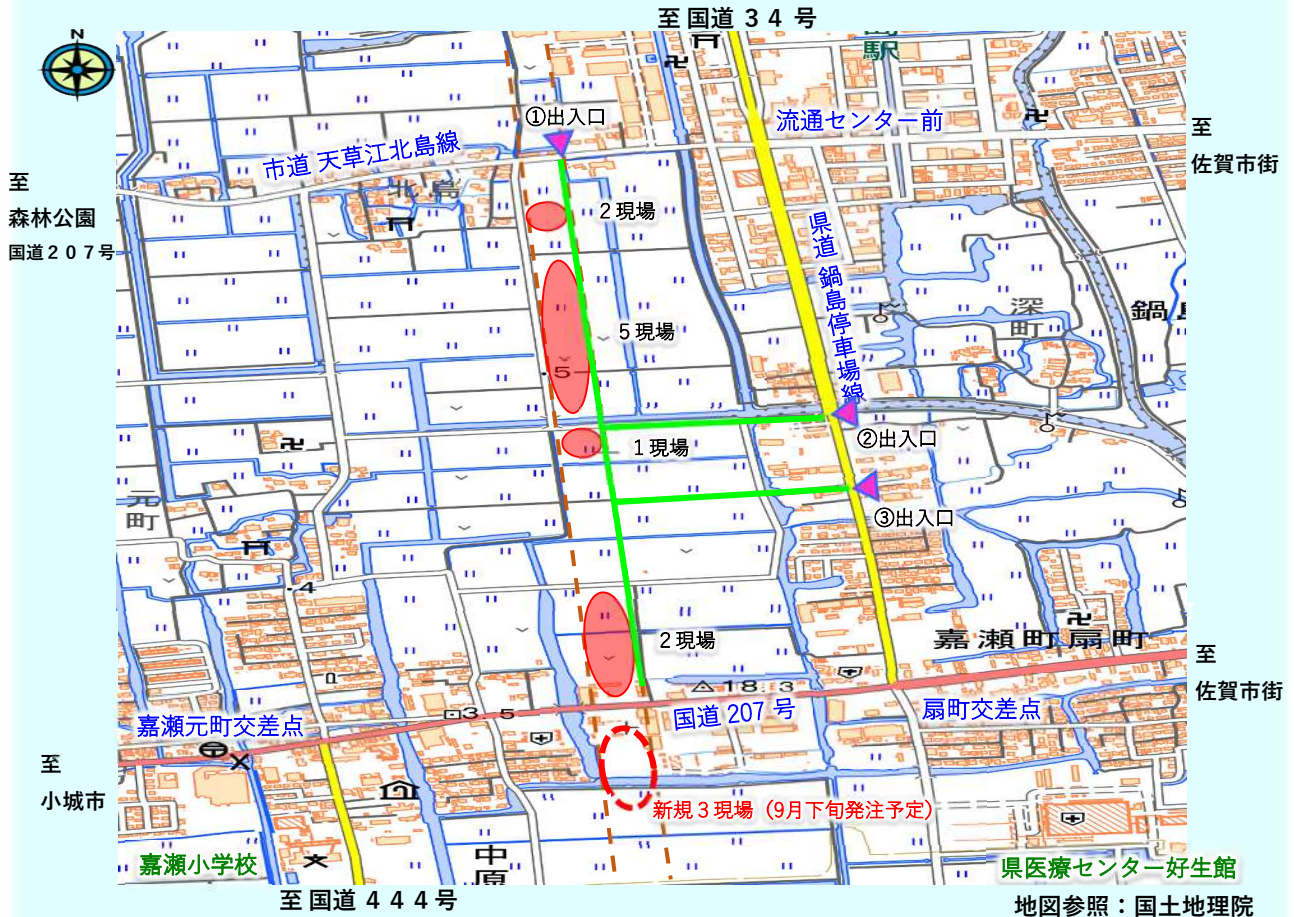

## 今後の工事予定（8月～10月）について


工事箇所	8月	9月	10月
①(株)政工務店	土工(杭頭処理・掘削)	地盤改良工(浅層混合処理)	路体盛土・排水構造物
②岡本建設(株)	杭頭処理	浅層改良	ふとんかご設置
③(株)山崎建設	深層混合処理	浅層混合処理	路体盛土
④牟田建設(株)	深層混合処理工	チェックボーリング	浅層混合処理工
⑤(株)西村土木建設	路体盛土No.81+10～No.87+5	浅層混合処理工準備	排水構造物準備
⑥(株)下村建設	路体盛土No.87～No.91	地盤改良(深層)	地盤改良(浅層)
⑦(株)峰組	埋戻し・場内整備	後片付け	工事完了
⑧松尾建設(株)	橋台工(バラベツト)	型枠解体	埋戻し・場内整備
⑨森永・江頭建設JV	養生	足場解体	路体盛土
⑩岡本建設(株)	杭頭処理	浅層混合処理	路体盛土
新規工事（3現場）	埋戻し	場内整備 後片付け	9月下旬発注予定 ※工事業者は次回11月の「工事だより」から掲載予定

工事箇所の丸数字は、次頁の施工箇所表示内の番号です。10月以降の予定は、11月にお知らせします


現在は、10箇所、「地元対応」、「安全対策」、「環境対策」を行い  
 工事を進めてまいります。

写真右下へ続く

### 扇町地区

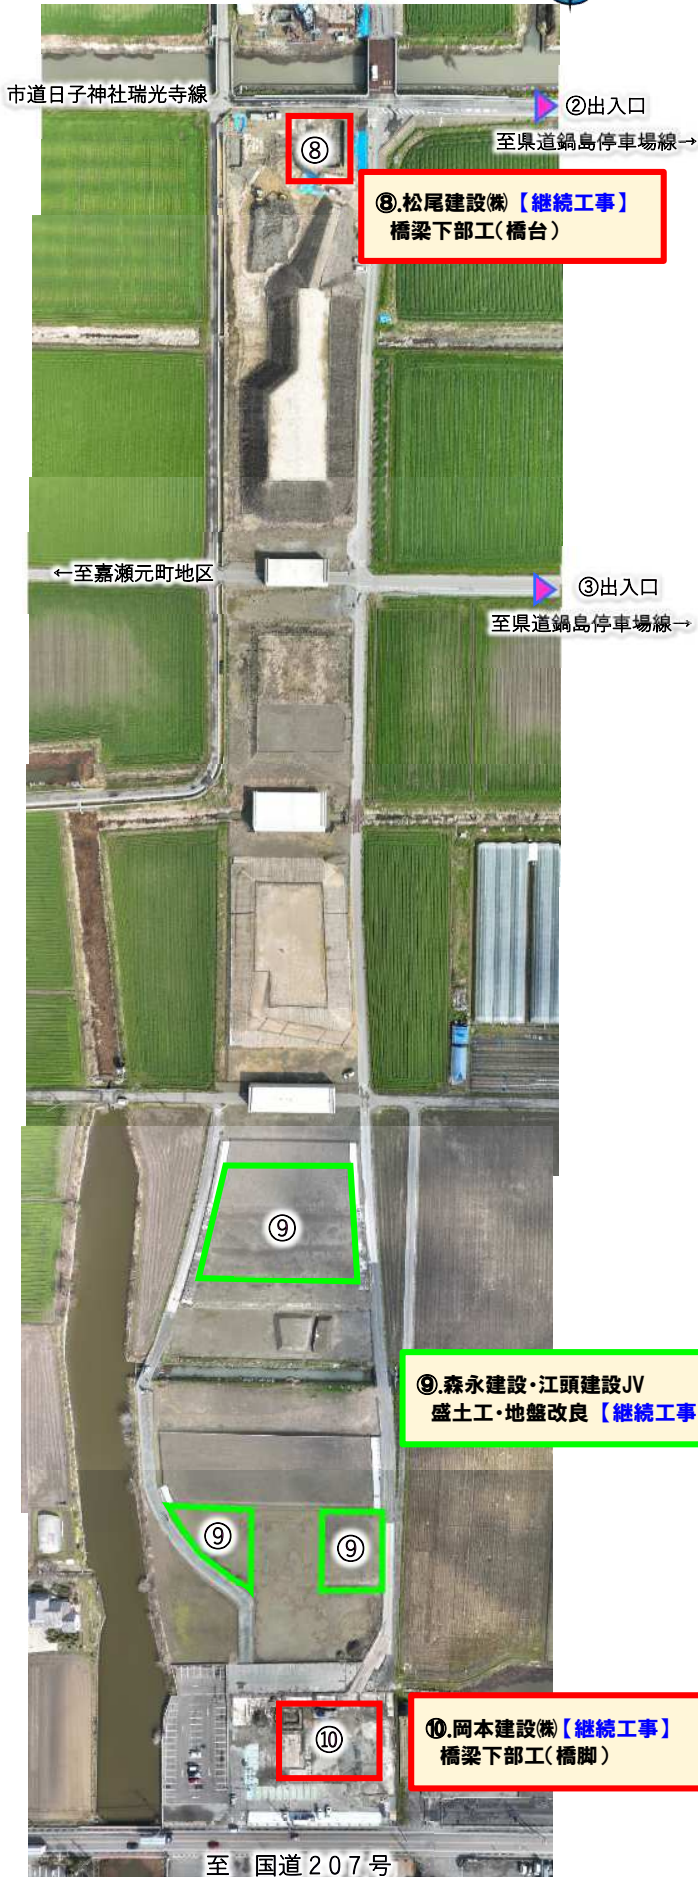


### 北島地区

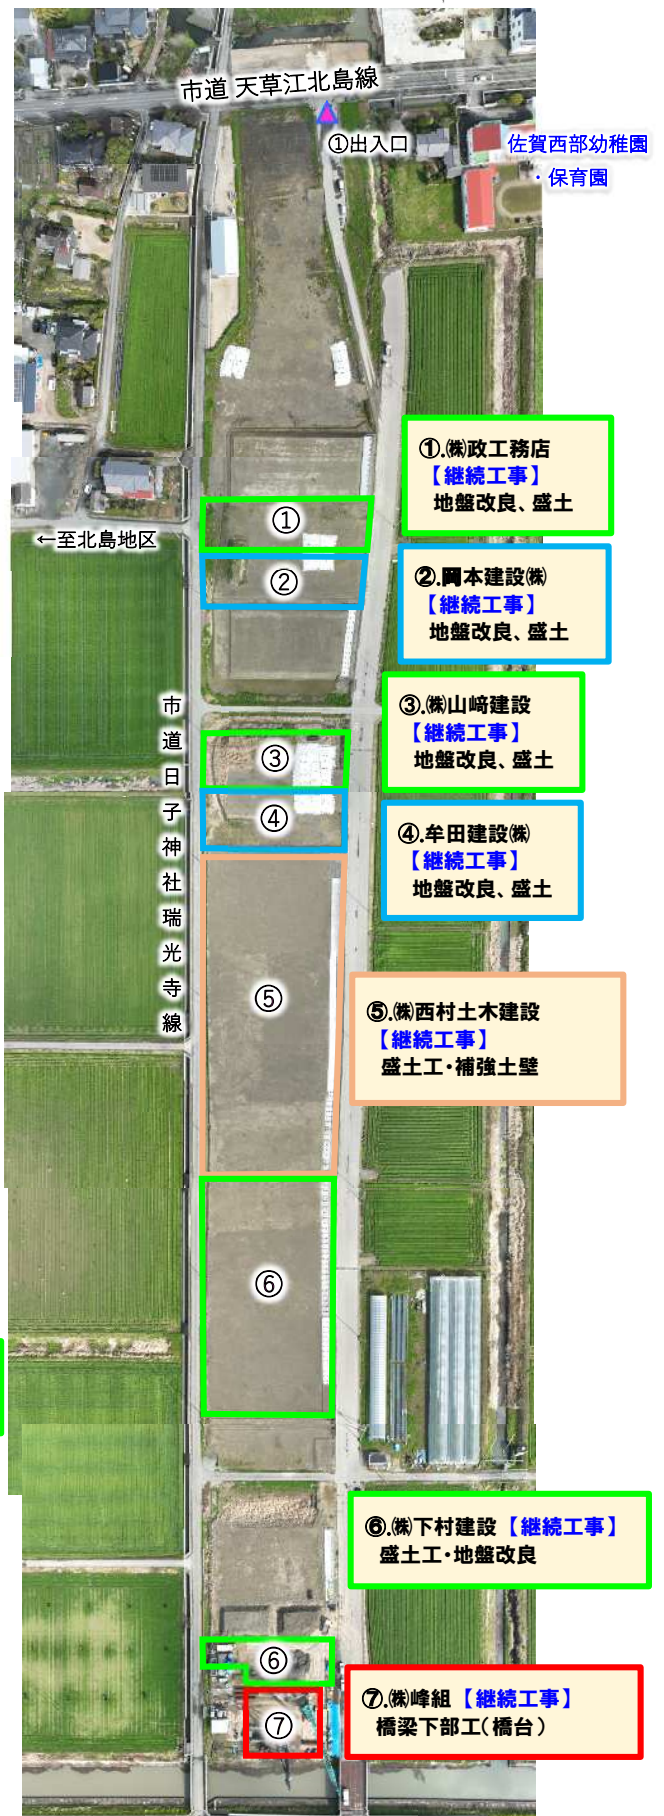

写真左上へ続く

# 有明海沿岸道路・佐賀唐津道路のパンフレットを 佐賀県のホームページで公開しています

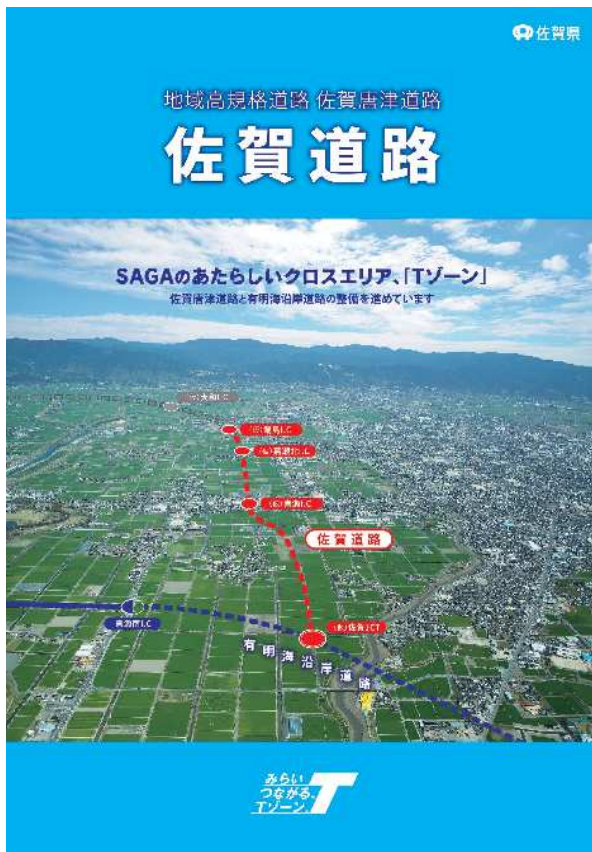

ホームページでは、開通状況を確認できる地図もご覧になれます  
有明海沿岸道路整備事務所 ホームページ  
<https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00389915/index.html>

## 鳥栖工業高校、唐津工業高校の土木科の生徒の方に 現場見学会を実施しました



R6.6.6鳥栖工業高校  
佐賀道路の事業概要について説明



R6.7.2唐津工業高校  
地盤改良の現場を見学
