

平成20年度再評価

11. 路線名：一般県道 牛津停車場線

事業名：地方道路交付金事業

一般県道 牛津停車場線 位置図



事業目的

JR 牛津駅



小城市牛津町
市街地

日常生活に密着した
重要な生活基盤道路

牛津小学校
の通学路

しかし、現道は…

幅員狭小
歩道無し

車と歩行者
の離合が危険

近接して踏切
が存在

よって、改良により

交通の円滑化と交通安全を確保
安全・安心な交通環境を形成

現道状況


未整備箇所は、通学者が危険にさらされている。



線形不良状況



幅員狭小状況

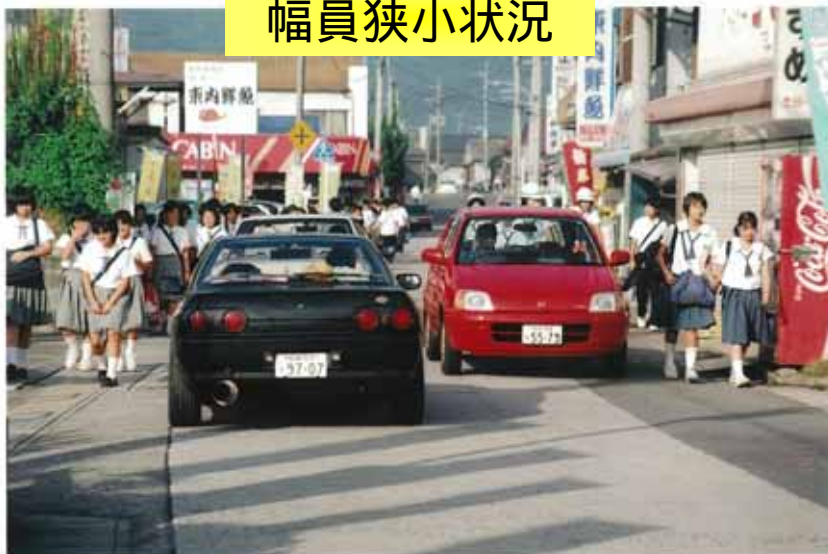

踏切状況



事業概要

- 全体事業費：11.6億円
- 工期：平成11年度～平成22年度(予定)
- 全体延長：L = 300m
- 事業内容：改良工 L = 300m
 - 用地買収 2,145m²
 - 家屋補償 17戸


一般県道 牛津停車場線 平面図

至国道207号

全体延長 L=300m



JR牛津駅

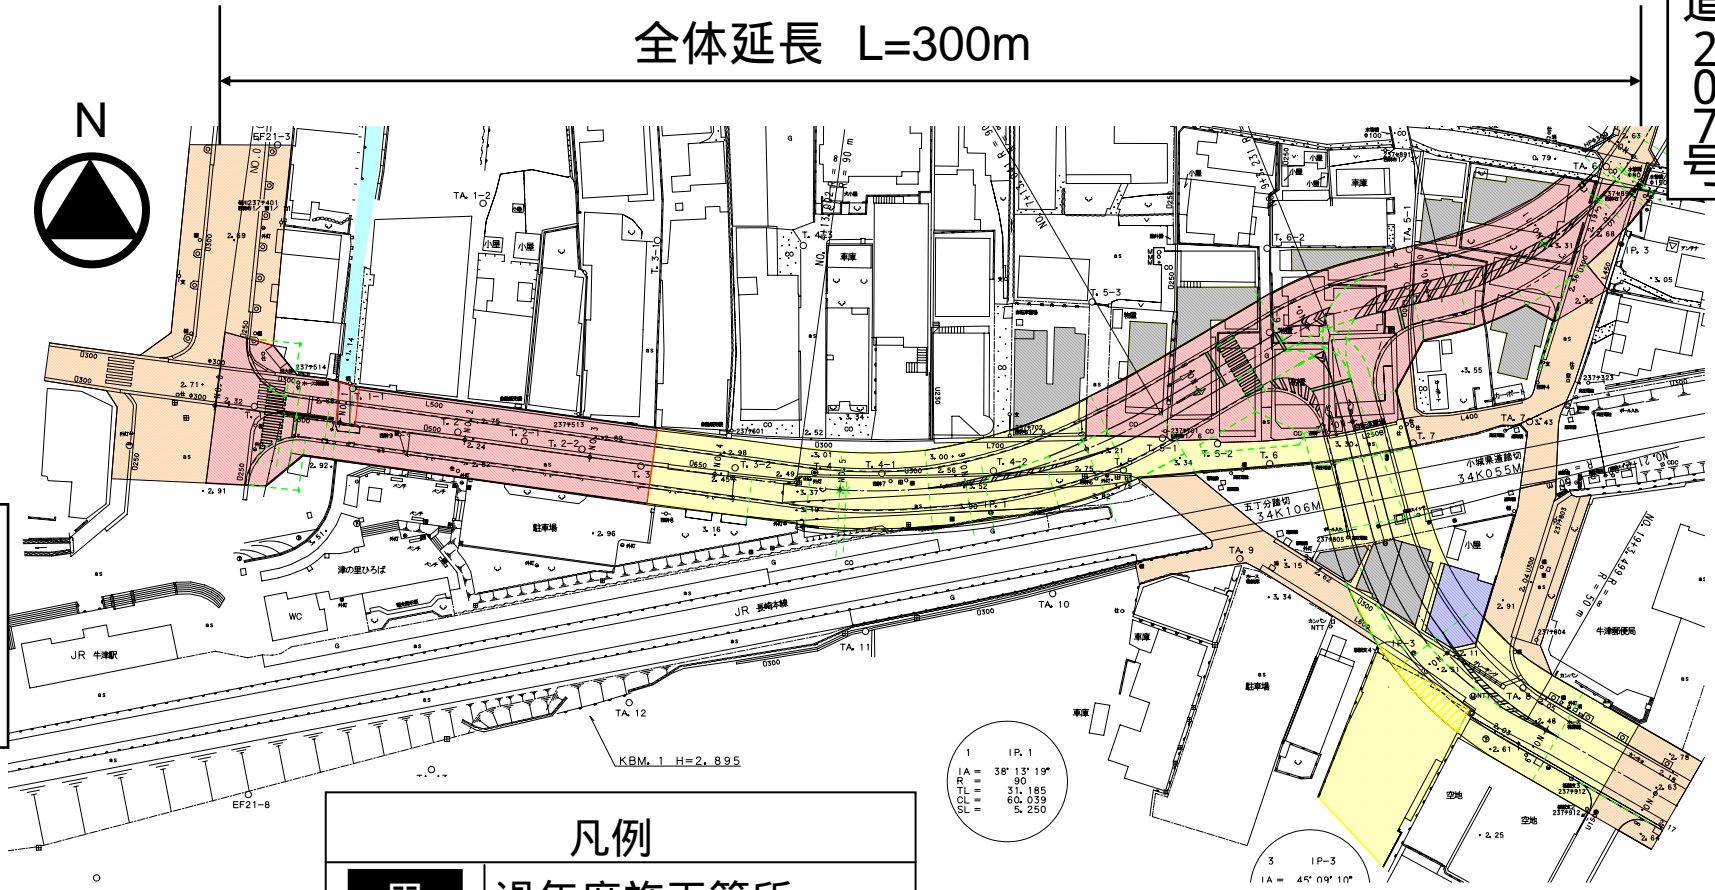

凡例	
黒	過年度施工箇所
青	平成19年度施工箇所
赤	平成20年度施工箇所
黄	次年度施工箇所

事業の進捗状況

	平成19 年度まで	平成20 年度	平成21 年度以降
事業費(億円)	9.8	1.3	0.5
進捗率(%)	84.5	95.3	100.0
用地進捗率 (%)	90.1	98.5	100.0

- 用地買収は、2,145㎡のうち、2,093㎡が契約済みである。
- 家屋補償は、12戸のうち、11戸が契約済みである。
- 工事は、交差点隅切部を一部暫定舗装している。

起点暫定舗装部



踏切部



事業の効果

- 交通安全事業(歩道設置)であるため
B / Cは算出しない。

今後の対応

- 当該箇所については、依然として危険な状況が解消されていないため、事業を継続し交通の円滑化と交通安全の確保を図る。
