

# 平成25年度 公共事業再評価


## 県営海岸保全施設整備事業(高潮対策)

### 西川副地区(佐賀市川副町)

平成25年10月

## 海岸保全施設整備事業とは・・・

「海岸法」に基づき指定した「海岸保全区域」において、海岸堤防等の「海岸保全施設」を整備し、住民の生命・財産を高潮や津波、波浪、浸食から防護することにより、国土の保全と民生の安定を図ることと目的とする事業です。

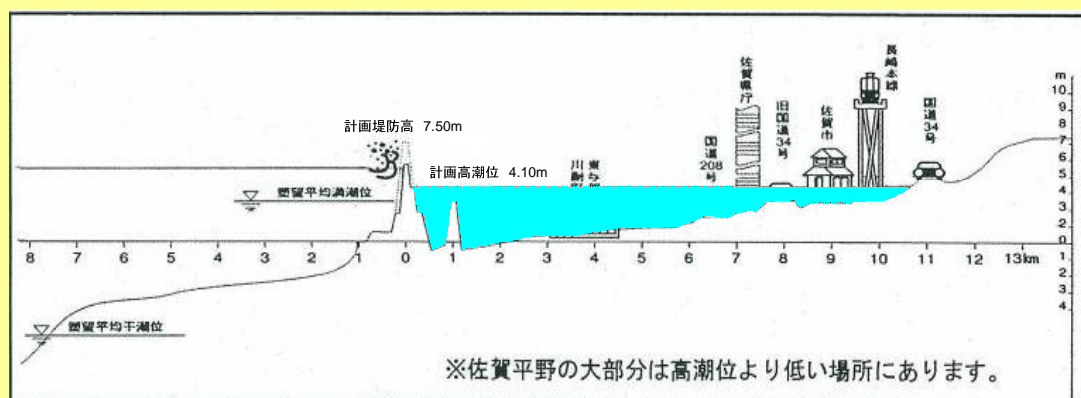

# 海岸保全施設整備事業の概要

## 海岸の現状

- ・本県は、台風の常襲地帯であり、たびたび高潮災害が発生
- ・有明海沿岸の海岸堤防は、沈下等による老朽化が進んでおり、防護機能が低下

## 事業の実施

消波工や堤防の嵩上げ等、  
緊急性の高い箇所からの整備

## 事業の効果

高潮、浸水被害の解消

## 現在の取組み

- 直轄海岸保全事業 2地区  
(国土交通省・農林水産省)
- 県営海岸保全事業 10地区






## 西川副地区の海岸堤防の現状

- ・海岸堤防は、干拓事業(S20~39)により造成
- ・有明海岸の沖積粘土などの極軟弱地盤上に築造  
⇒ 不等沈下による亀裂等が発生
- ・堤防高は、伊勢湾台風クラスを想定し、T.P+7.5m  
(既設+6.6m)で設定




## 過去の台風による被害 (昭和60年台風13号)

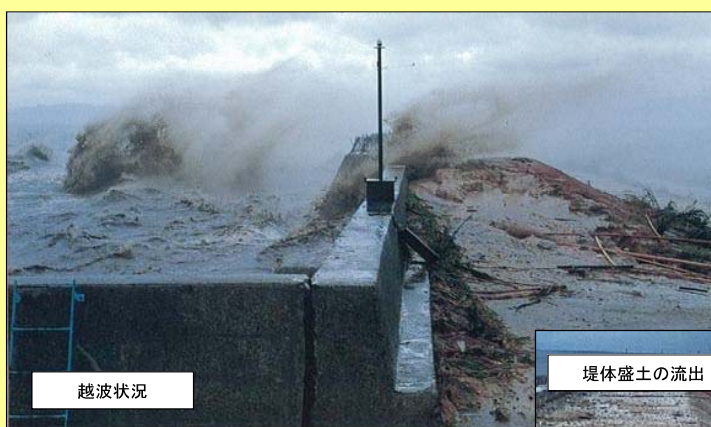

## 西川副地区 海岸保全施設整備事業 概要

### 【全体計画】

- ・事業着手年度 昭和46年度
- ・完了予定年度 平成51年度
- ・整備延長 2,952m
- ・主要工種 堤防工、消波工、樋門工(1箇所)
- ・防護面積 457ha  
(農用地366ha、宅地4ha、その他87ha)
- ・総事業費 4,657百万円
- ・進捗率 68.0%(平成24年度末 事業費ベース)

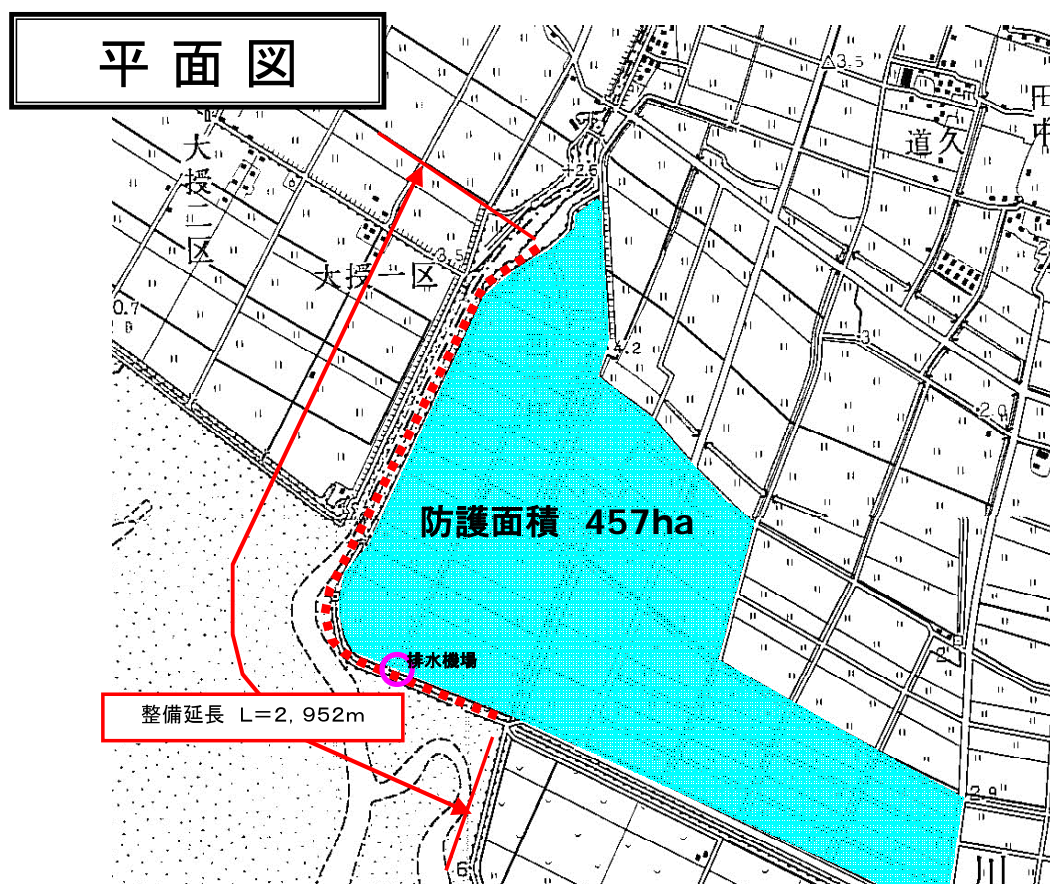

## 費用便益比 B/C

総費用額C: 施設整備に要する総費用

総便益額B: 施設整備によってもたらされる総便益額  
(被害防止額)

総費用C(現在価値化): 12,863百万円

総便益B(現在価値化): 16,375百万円

※ 費用便益比(B/C) =  $16,375 \div 12,863 = 1.27$

### 事業の継続について

事業  
の  
必要  
性

- ・地区は、高潮位より標高が低く、来襲する台風の規模やコースによっては、高潮災害や越波による塩害が発生する危険性がきわめて高い。
- ・背後地には、干拓事業で造成された優良農地や排水機場、一般の家屋等も存在

事業の実施により

- ・防災上の安全度の向上
- ・高潮被害の解消、防止
- ・地域住民の生命・財産と安全安心の確保

以上のことから、事業の継続が必要です。
