

令和2年度 再評価委員会


事業名：道路整備交付金事業

路線名：主要地方道 きたしげやすみたがわ 北茂安三田川線 にしおはし (西尾橋工区)

事業地：三養基郡みやき町東尾・中津隈

事業採択後10年経過のため再評価

位置図

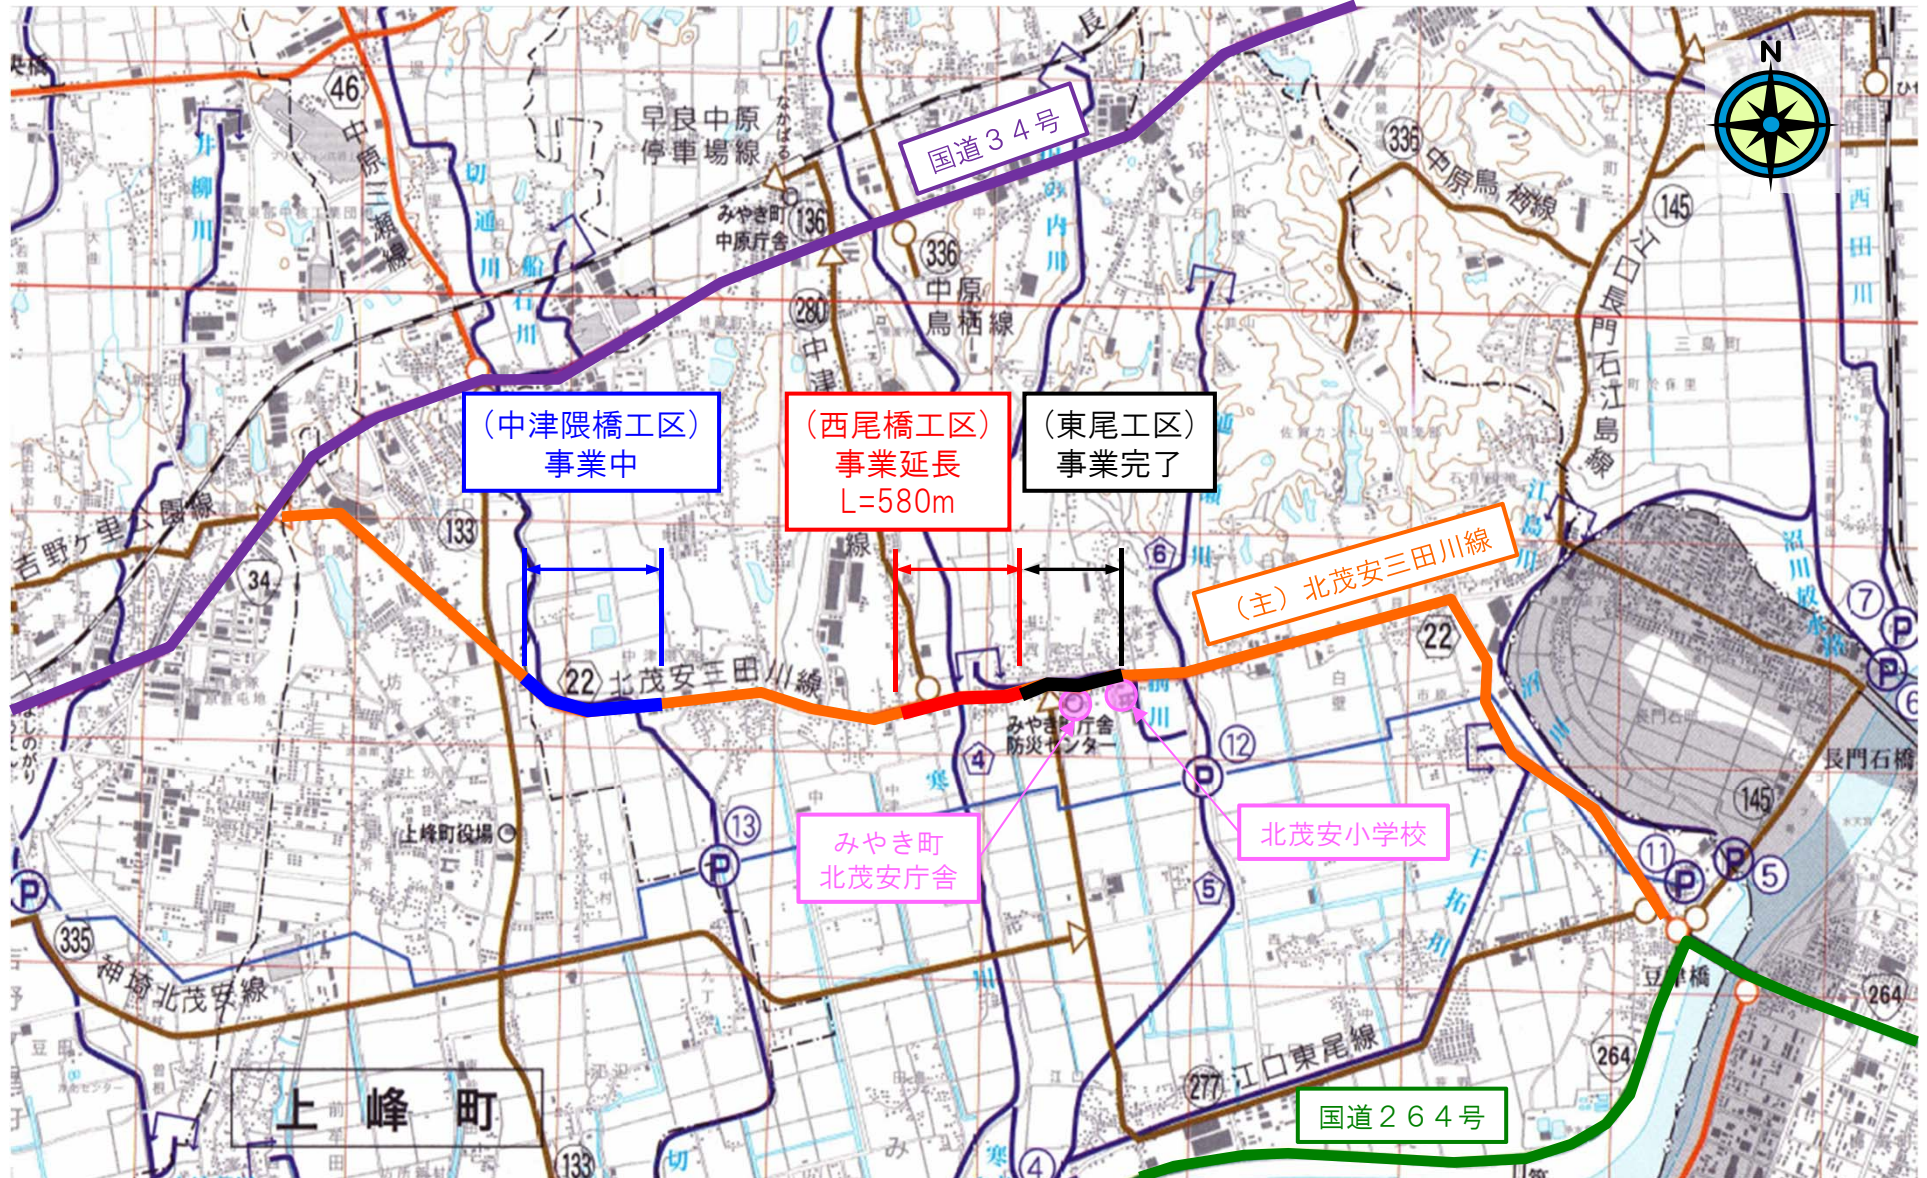

事業目的

歩道幅員が狭く児童が
危険にさらされている！



通学路に指定されており多くの
児童が通行している！



歩道整備により

通学児童の安全性の向上


事業概要

全体事業費	17.0億円
工期	平成23年度～令和8年度
全体延長	580m
計画幅員	6.5(15.0)m
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・改良工 L=580m・舗装工 L=580m・橋梁 N=1橋・測試 N=一式・用地補償 N=一式

事業の進捗状況

	令和元年度まで	令和2年度	令和3年度以降
事業費(億円)	10.1	0.7	6.2
進捗率(%)	59.4	63.5	100.0
用地進捗率(%)	83.0	83.0	100.0

平面図

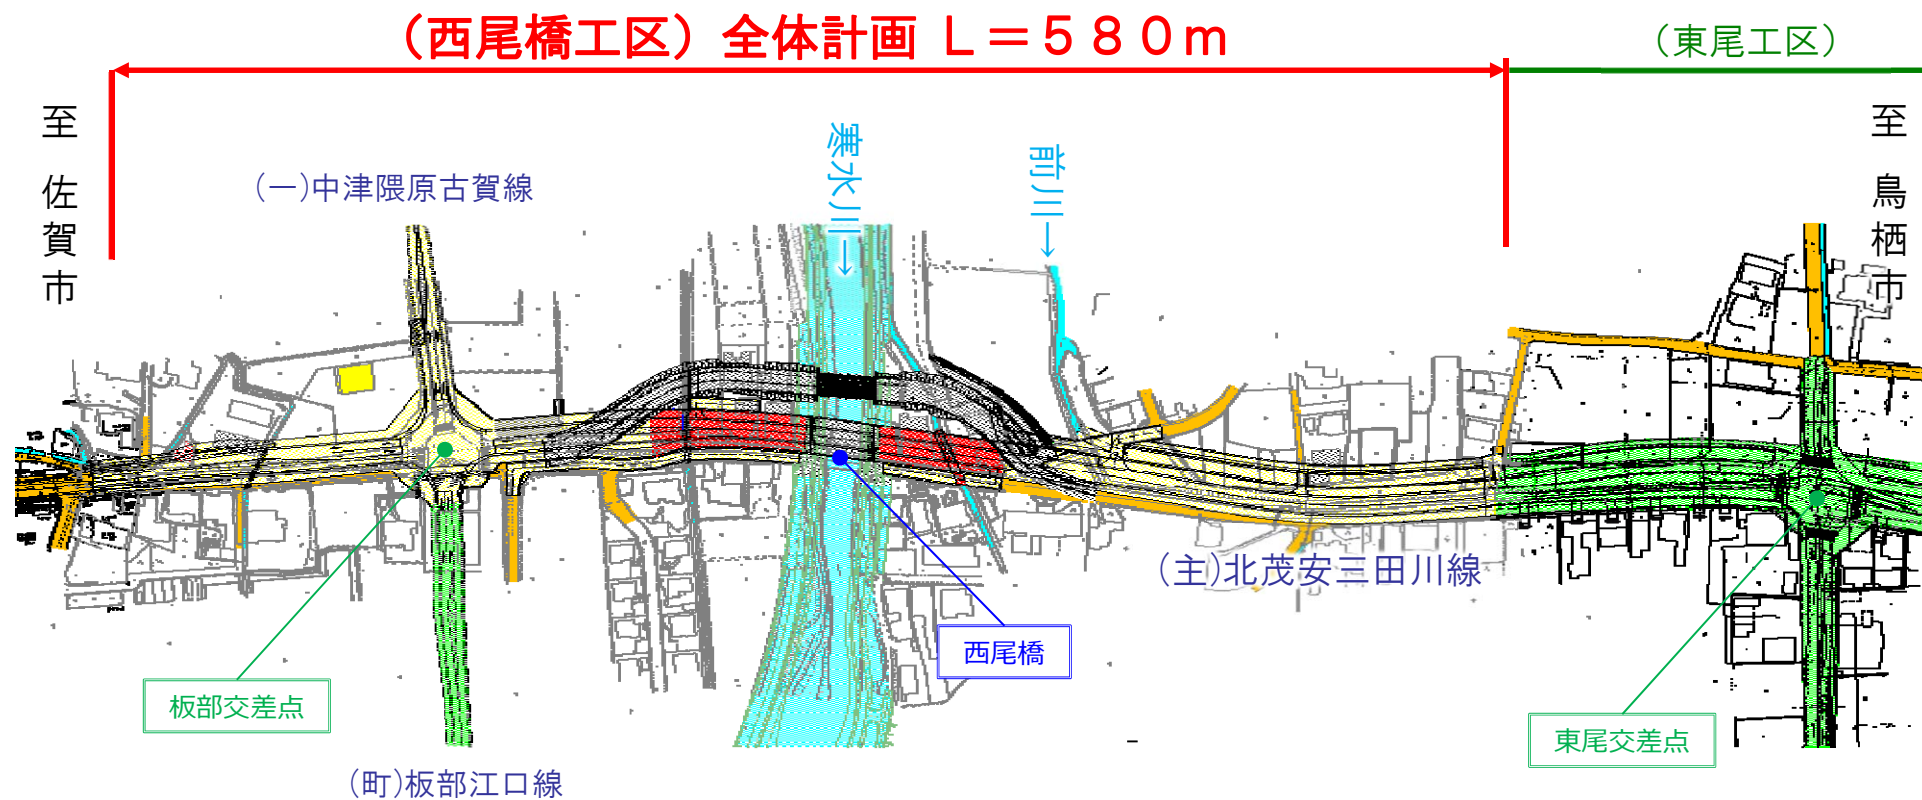

凡例	
黒	令和元年度まで
赤	令和2年度施工箇所
黄	次年度以降施工箇所

令和2年 現地状況

起点側より（東側より西側を望む）





西尾橋（新橋）（西側より東側を望む）




横断図

現況

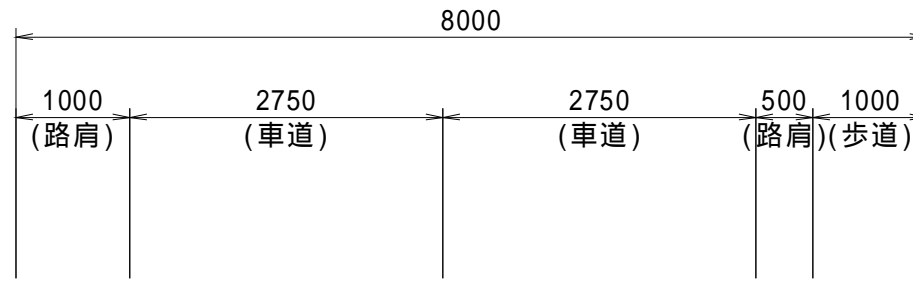

計画

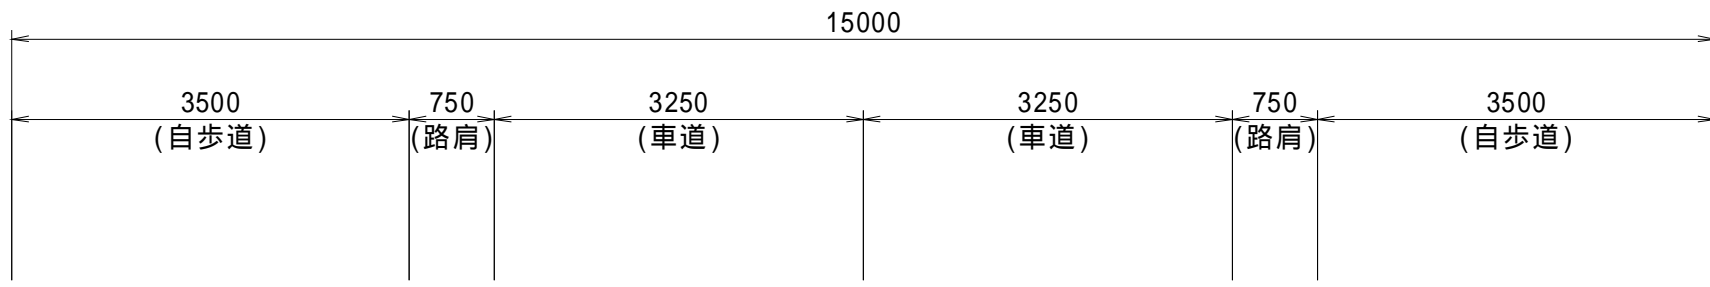

事業を巡る社会経済情勢等の変化

○全国で通学路での死傷事故が相次ぎ発生したことを受け、通学路の緊急点検(H24)が実施され、その結果を基に策定された「みやき町通学路交通安全プログラム(H27.3)」の対策必要箇所指定された。

○沿道やその周辺において、新たに住宅地等の開発が進み、歩行者数は増加傾向にある。

コスト縮減や代替案等の可能性

(コスト縮減)

○工事で発生する残土を盛土等に流用する。

(代替案の検討)

○特になし

対応方針（事業課案）

○当該箇所の事業の必要性に変化がなく、交通の円滑化と交通安全を図るため、事業を継続したい。
